



COMUNE DI RACCONIGI

Provincia di Cuneo

Riqualificazione e adeguamento igienico sanitario delle aree mercatali - Via San Giovanni

COMMITTENTE

Comune di Racconigi
Piazza Carlo Alberto 1
12035 Racconigi (Cn)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pier Beppe Canello

PROGETTO

STUDIO DI ARCHITETTURA BALBI E RINAUDO



via A. Perfumo 1 15122 Spinetta Marengo (AL)
Tel. - Fax. : 0131 617473
e-mail: studio.ber@tin.it

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

Cronoprogramma dei lavori

DATA

11/2014

SCALA

INDICE


A


DISEGNO N.

L

FILE

ID	Nome attività	Durata	Importo	16 mar 15					23 mar 15						
				18	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Allestimento cantiere	4 g	0,00	[Barre blu e gialle]											
2	Demolizioni e scavi	11 g	38'783,54	[Barre blu e gialle]											
3	Sottofondi e fondazioni stradali	11 g	24'354,83	[Barre blu e gialle]											
4	Pavimentazioni	26 g	84'346,99	[Barre blu e gialle]											
5	Impianto scarico acque meteoriche e predisposizioni	10 g	6'683,55	[Barre blu e gialle]											
6	Elementi di arredo	1 g	10'831,09	[Barre blu e gialle]											
7	Smobilitazione cantiere	1 g	0,00	[Barre blu e gialle]											

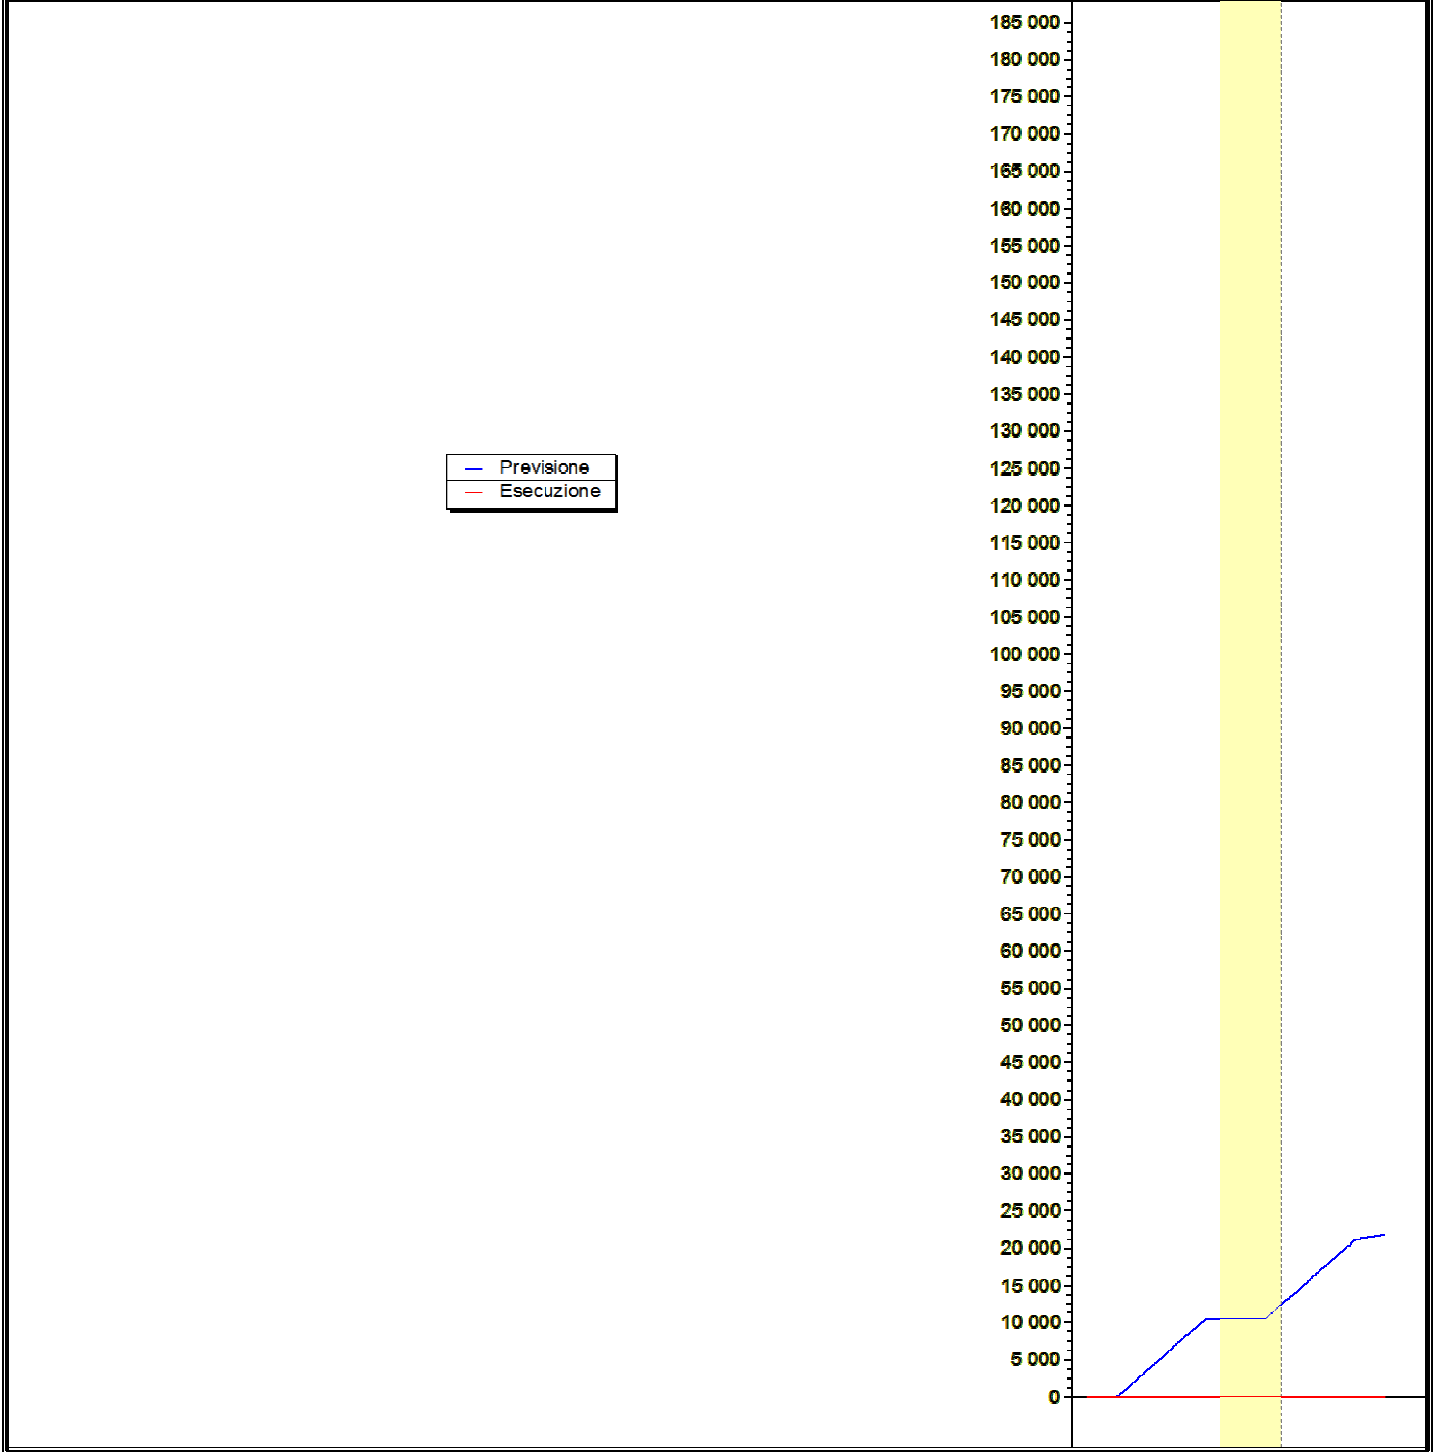

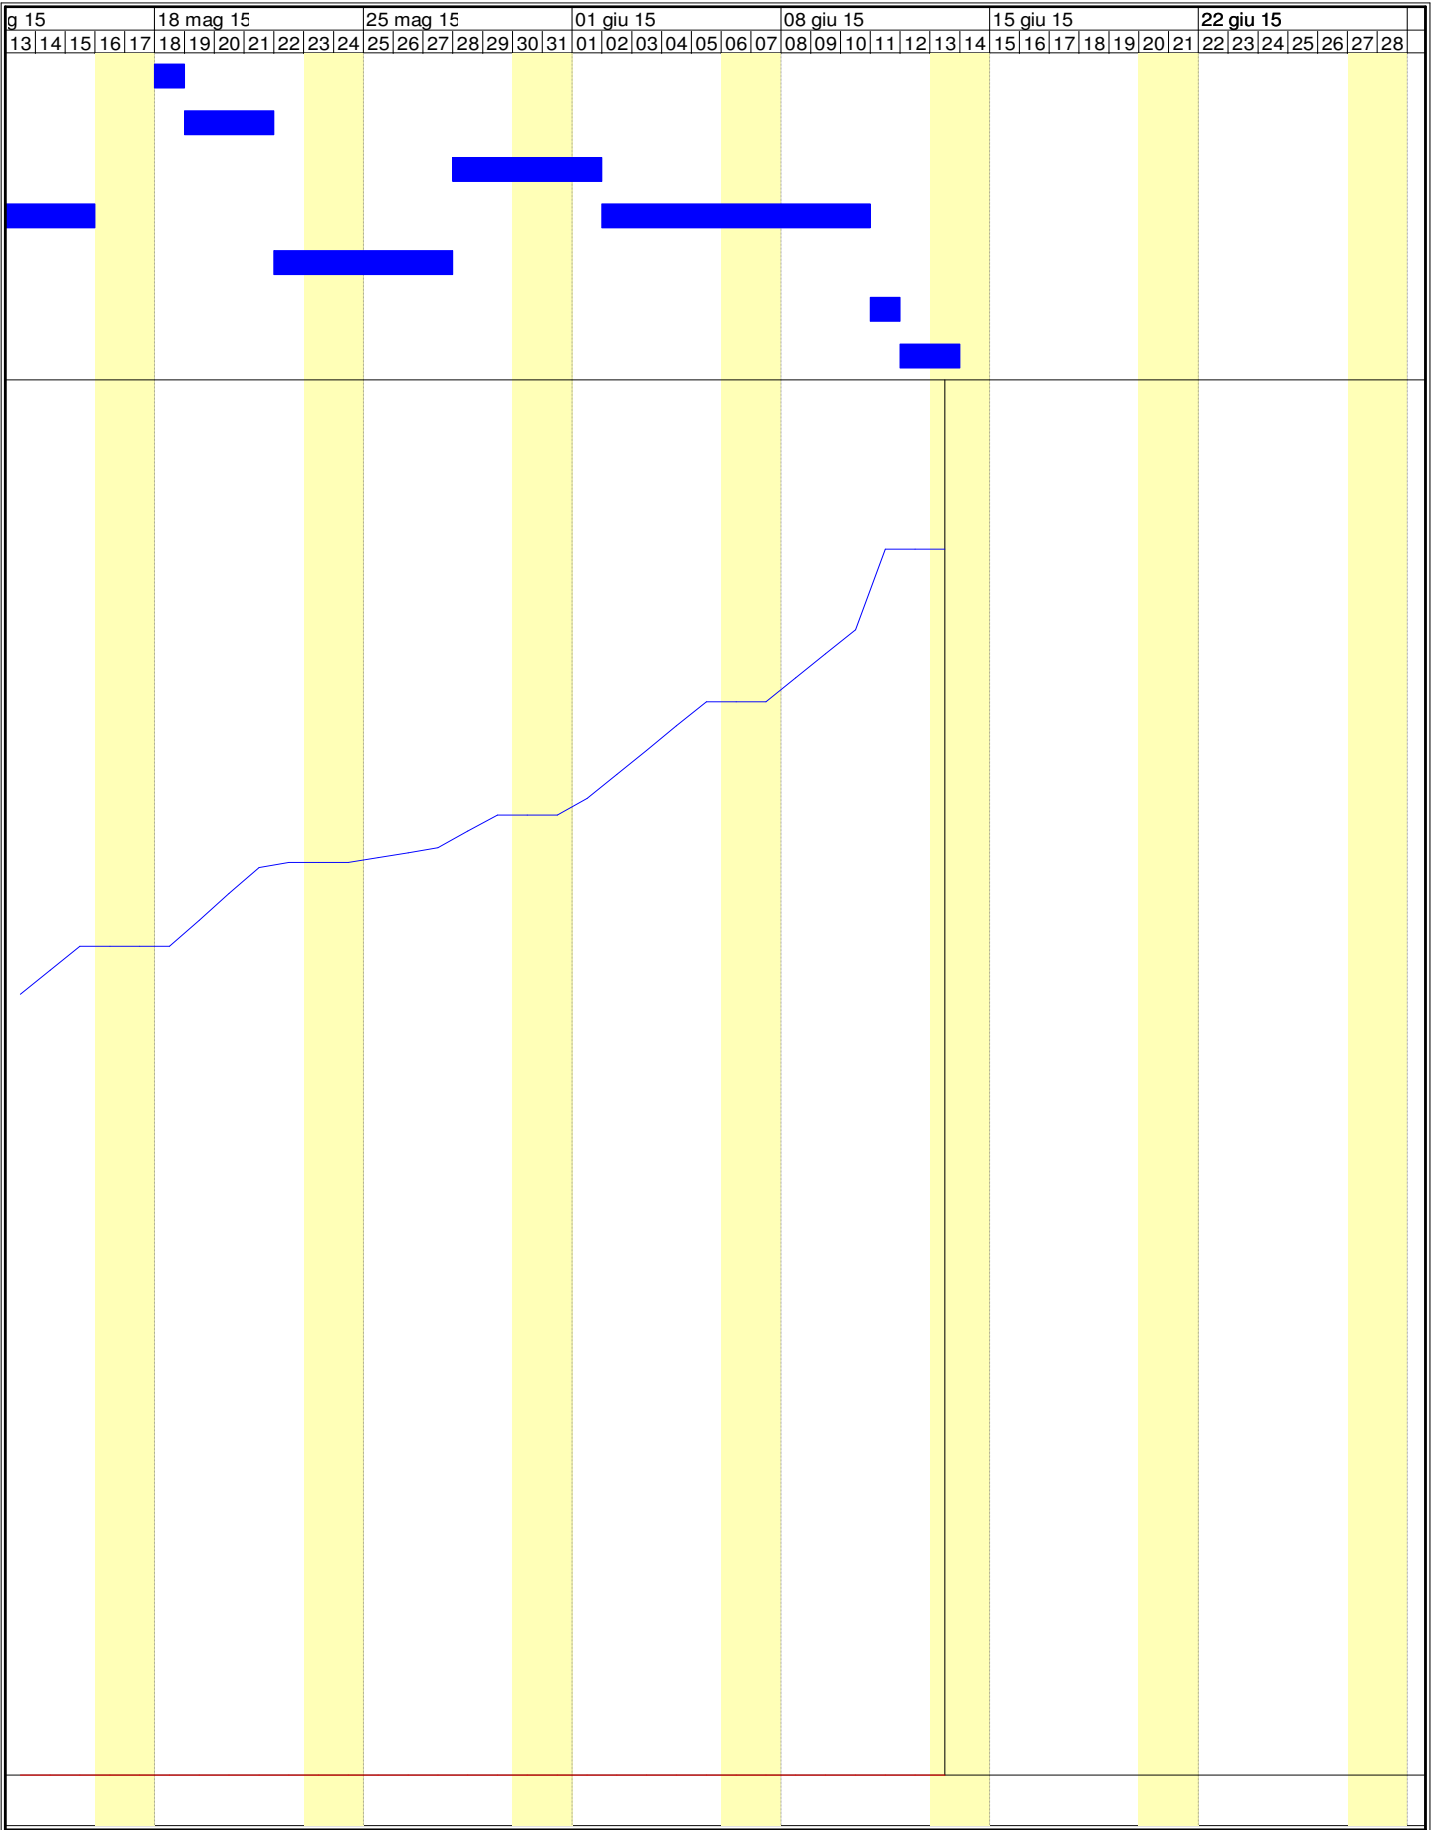

Città di Racconigi

Provincia di Cuneo

Tabella Attività

OGGETTO: Riqualificazione e adeguamento igienico sanitario delle aree mercatali
COMMITTENTE: Città di Racconigi

Racconigi, 13/11/2014

Il Tecnico
()

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	Euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento cantiere	0,00	0,00	16/03/2015	18/05/2015	4	4
<i>periodo 01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16/03/2015</i>	<i>17/03/2015</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>periodo 02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21/04/2015</i>	<i>21/04/2015</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>periodo 03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18/05/2015</i>	<i>18/05/2015</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Demolizioni e scavi	38'783,54	23,51	18/03/2015	21/05/2015	11	13
<i>periodo 01</i>	<i>21'154,66</i>	<i>12,82</i>	<i>18/03/2015</i>	<i>25/03/2015</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
<i>periodo 02</i>	<i>7'051,55</i>	<i>4,27</i>	<i>22/04/2015</i>	<i>23/04/2015</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>periodo 03</i>	<i>10'577,33</i>	<i>6,41</i>	<i>19/05/2015</i>	<i>21/05/2015</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Sottofondi e fondazioni stradali	24'354,83	14,76	01/04/2015	01/06/2015	11	15
<i>periodo 01</i>	<i>11'070,38</i>	<i>6,71</i>	<i>01/04/2015</i>	<i>07/04/2015</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
<i>periodo 02</i>	<i>6'642,23</i>	<i>4,03</i>	<i>28/04/2015</i>	<i>30/04/2015</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>periodo 03</i>	<i>6'642,23</i>	<i>4,03</i>	<i>28/05/2015</i>	<i>01/06/2015</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Pavimentazioni	84'346,99	51,12	08/04/2015	10/06/2015	26	34
<i>periodo 01</i>	<i>29'197,04</i>	<i>17,70</i>	<i>08/04/2015</i>	<i>20/04/2015</i>	<i>9</i>	<i>13</i>
<i>periodo 02</i>	<i>32'441,15</i>	<i>19,66</i>	<i>04/05/2015</i>	<i>15/05/2015</i>	<i>10</i>	<i>12</i>
<i>periodo 03</i>	<i>22'708,81</i>	<i>13,76</i>	<i>02/06/2015</i>	<i>10/06/2015</i>	<i>7</i>	<i>9</i>
Impianto scarico acque meteoriche e predisposizioni	6'683,55	4,05	26/03/2015	27/05/2015	10	16
<i>periodo 01</i>	<i>2'673,42</i>	<i>1,62</i>	<i>26/03/2015</i>	<i>31/03/2015</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
<i>periodo 02</i>	<i>1'336,71</i>	<i>0,81</i>	<i>24/04/2015</i>	<i>27/04/2015</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
<i>periodo 03</i>	<i>2'673,42</i>	<i>1,62</i>	<i>22/05/2015</i>	<i>27/05/2015</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
Elementi di arredo	10'831,09	6,56	11/06/2015	11/06/2015	1	1
Smobilizzo cantiere	0,00	0,00	12/06/2015	13/06/2015	1	2
Racconigi, 13/11/2014						
il Tecnico						

Città di Racconigi

Provincia di Cuneo

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Riqualificazione e adeguamento igienico sanitario delle aree mercatali

COMMITTENTE: Città di Racconigi

Racconigi, 13/11/2014

Il Tecnico
()

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale Euro	Progressivo Euro	(%)
18/03/2015	3'525,78	3'525,78	2,14
19/03/2015	3'525,78	7'051,55	4,27
20/03/2015	3'525,78	10'577,33	6,41
23/03/2015	3'525,78	14'103,11	8,55
24/03/2015	3'525,78	17'628,88	10,68
25/03/2015	3'525,78	21'154,66	12,82
26/03/2015	668,36	21'823,01	13,23
27/03/2015	668,36	22'491,37	13,63
30/03/2015	668,36	23'159,72	14,04
31/03/2015	668,36	23'828,08	14,44
01/04/2015	2'214,08	26'042,15	15,78
02/04/2015	2'214,08	28'256,23	17,12
03/04/2015	2'214,08	30'470,30	18,47
06/04/2015	2'214,08	32'684,38	19,81
07/04/2015	2'214,08	34'898,46	21,15
08/04/2015	3'244,12	38'142,57	23,12
09/04/2015	3'244,12	41'386,69	25,08
10/04/2015	3'244,12	44'630,80	27,05
13/04/2015	3'244,12	47'874,92	29,02
14/04/2015	3'244,12	51'119,03	30,98
15/04/2015	3'244,12	54'363,15	32,95
16/04/2015	3'244,12	57'607,26	34,91
17/04/2015	3'244,12	60'851,38	36,88
20/04/2015	3'244,12	64'095,49	38,85
22/04/2015	3'525,78	67'621,27	40,98
23/04/2015	3'525,78	71'147,04	43,12
24/04/2015	668,36	71'815,40	43,52
27/04/2015	668,36	72'483,75	43,93
28/04/2015	2'214,08	74'697,83	45,27
29/04/2015	2'214,08	76'911,90	46,61
30/04/2015	2'214,08	79'125,98	47,96
04/05/2015	3'244,12	82'370,09	49,92
05/05/2015	3'244,12	85'614,21	51,89
06/05/2015	3'244,12	88'858,32	53,85
07/05/2015	3'244,12	92'102,44	55,82
08/05/2015	3'244,12	95'346,55	57,79
11/05/2015	3'244,12	98'590,67	59,75
12/05/2015	3'244,12	101'834,78	61,72
13/05/2015	3'244,12	105'078,90	63,68
14/05/2015	3'244,12	108'323,01	65,65
15/05/2015	3'244,12	111'567,13	67,62
19/05/2015	3'525,78	115'092,91	69,75
20/05/2015	3'525,78	118'618,68	71,89
21/05/2015	3'525,78	122'144,46	74,03
22/05/2015	668,36	122'812,81	74,43
25/05/2015	668,36	123'481,17	74,84
26/05/2015	668,36	124'149,52	75,24
27/05/2015	668,36	124'817,88	75,65
28/05/2015	2'214,08	127'031,95	76,99
29/05/2015	2'214,08	129'246,03	78,33
01/06/2015	2'214,08	131'460,11	79,67
02/06/2015	3'244,12	134'704,22	81,64
03/06/2015	3'244,12	137'948,34	83,61
04/06/2015	3'244,12	141'192,45	85,57
05/06/2015	3'244,12	144'436,57	87,54
08/06/2015	3'244,12	147'680,68	89,50
09/06/2015	3'244,12	150'924,79	91,47
10/06/2015	3'244,12	154'168,91	93,44
11/06/2015	10'831,09	165'000,00	100,00
Racconigi, 13/11/2014			
il Tecnico			
